



桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、 會勘案由：「同德綠廊環境改善工程」南平段設計及圍牆新建範圍討論案
- 二、 會勘時間：中華民國 111 年 4 月 7 日（星期三）上午 10 時
- 三、 會勘地點：桃園市桃園區南平路 502 號旁
- 四、 主持人：廖家志股長 紀錄：紀政杰
- 五、 出席人員：詳簽到單
- 六、 會勘經過

（一）桃園區寶安里里長：

1. 南平路段之入口，去年與市府都市發展局申請社區總體營造計畫，辦理現場綠美化，現場維護良好請維持既有樣貌，倘施工進出需若有影響，請施工廠商於施工完畢後依現況復原。
2. 既有南平路工區入口圍牆不穩，請已一併改善。

（二）豪門社區居民：

1. 原設計新建圍牆影響住家後門出入及逃生孔，請水務局是否可以留逃生通道給居民，並將圍牆調整為綠籬，安全問題將自行負責。
2. 施工開挖階段可能挖到住家污水管線，請水務局協助留管俾利後續排放污水。

（三）崇峻工程顧問有限公司：

配合所提建議進行設計調整。


（四）源鑫營造有限公司：

1. 施工時發現步道銜接處有既有涵管(原設計圖說沒有)，在銜接步道上 有難度，請設計單位和水務局研議評估。
2. 為配合串聯步道，需將原圍牆敲除，俾利後需施工。
3. 中正公園段作污水接管，因實際斷面較設計圖說小，是否縮小原設計圖說上的集水井尺寸以保持水流順暢。

七、 會勘結論：

- (一)南平路段工區入口，將邀集都市發展局就現況作為供學童行走之步道可行性進行協調後續辦。
- (二)南平路步道入口處磚牆不穩情形，請設計單位納入變更追加所需欄杆數量。
- (三)關於居民提出新建圍牆影響住家後門及逃生問題，請依民眾所需調整為綠籬，相關安危問題請住戶及社區自行負責。另原有設計之圍牆將調整施做，請設計單位納入變更調整。
- (四)污水留管部分本局再行研議，請施工廠商施工時盡量避開原有管線，另豪門社區西棟(315、317、319 號)三戶住家目前尚未接管請本局污促科協助辦理。
- (五)中正公園污水集水井尺寸依原圖施作將影響通水，經設計單位建議變更為 40*60*60(公分)以利排水，爰請設計單位調整尺寸並納入變更設計內容。
- (六)步道銜接處兩端有高差，現況亦發現既有涵管，請設計單位於界址釐清及高程測量完畢後，提出步道銜接方式，已利廠商施工。

八、 會勘照片：

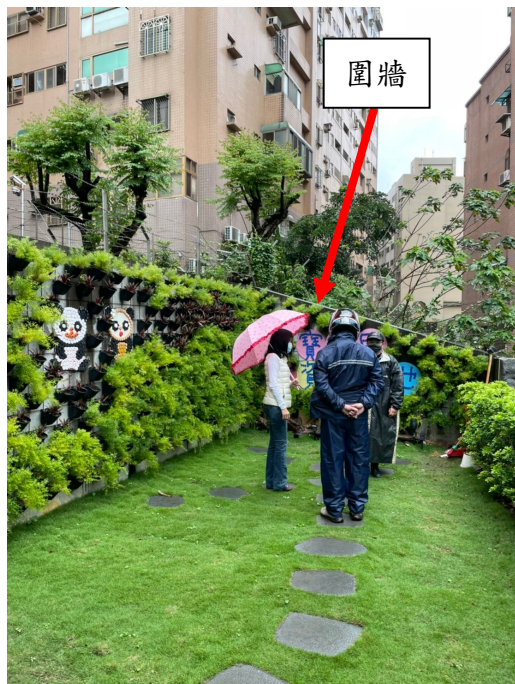

會勘



南平路入口處之磚瓦裸露



既有箱涵



居民住家後門及逃生孔



變更集水井尺寸



桃園市政府水務局

簽到表

- 一、 會勘事由：「同德綠廊環境改善工程」南平段設計及圍牆新建範圍討論案
- 二、 會勘時間：中華民國 111 年 4 月 7 日（星期三）上午 10 時
- 三、 會勘地點：桃園市桃園區南平路 502 號旁
- 四、 主持人：廖家志股長 紀錄：紀政杰

單位	簽名	備註
桃園區寶安里里長	陳月花	
崇峻工程顧問有限公司	湯發順、張壯文	
源鑫營造有限公司	周耀河	
豪門社區 313 號	梁棍發	
豪門社區 319 號	黃碧蓮	
豪門社區 321 號	彭淑鈴	
豪門社區 323 號	戴先生	
本府水務局	紀政杰	

